

# Relatório de Fiscalização das Grandes Obras



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

## 1. IDENTIFICAÇÃO

<b>Nº do Relatório de Publicação:</b>	01/2013
<b>Empreendimento:</b>	Acquário Ceará
<b>Objeto da fiscalização:</b>	Construção do Acquário Ceará
<b>Órgão/Entidade fiscalizado(a):</b>	Secretaria do Turismo – SETUR
<b>Processo de acompanhamento da obra:</b>	02233/2012-9
<b>Relator do processo:</b>	Conselheiro Edilberto Pontes

## 2. ATIVIDADES DA COMISSÃO

<b>Período das atividades:</b>	09/03/2012 a 09/11/2012
<b>Data da inspeção:</b>	18/09/2012

### Execução físico-financeira:

<b>Nº do Contrato</b>	<b>Valor Total Atualizado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>% Executado do Contrato*</b>
31/2010	R\$ 18.490.859,21	R\$ 4.778.541,19	25,84%
17/2011	R\$ 244.335.000,00	R\$ 876.000,00	0,36%
08/2012	R\$ 3.143.729,60	R\$ 2.686.348,40	85,45%

\* Valores calculados com base em informações disponíveis no Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC.

### Atividades desenvolvidas:

A equipe de auditoria reuniu-se com representantes da SETUR, em 13/09/2012, visando informar o reinício das atividades da Comissão, visto a retomada dos serviços de construção do Acquário Ceará. Na ocasião, foi entregue uma solicitação de documentos, os quais foram disponibilizados, tempestivamente, em 19/09/2012.

Em 18/09/2012, foi realizada uma vistoria no canteiro da obra com o intuito de averiguar o seu andamento. Confirmado reinício da obra, observou-se que a entrega das estacas-prancha (objeto do Contrato nº 08/2012) e a cravação destas (objeto do Contrato nº 31/2010) estavam concluídas. Os representantes da SETUR e DAE, presentes na vistoria retrocitada, informaram à Equipe que seriam executados o corte das estacas-prancha e expurgo do excedente retirado. Em seguida, virão as etapas de movimentação de terra (escavação, carga, transporte e expurgo) e atirantamento da cortina metálica (estacas-prancha metálicas) em dois níveis de tirantes.

Durante o período das atividades, a Comissão procedeu análise de parte dos documentos entregues, especialmente dos referentes à contratação por inexigibilidade da empresa Internacional Concept Management INC – Contrato nº 17/2011. Por fim, elaborou o Relatório de Inspeção nº 11/2012, o qual subsidiou este Relatório de Publicação.

## 3. ACHADOS DE AUDITORIA

Este tópico apresenta um resumo da opinião técnica expressa nos Relatórios de Inspeção desta Comissão em relação às situações encontradas em desacordo com os critérios adotados para fiscalização. Conforme decidido pelo Pleno do TCE/CE, em Sessão Ordinária realizada em

**18/12/2012, os achados de auditoria somente terão publicidade após pronunciamento dos gestores públicos envolvidos, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.**

O achado de auditoria apresentado no Relatório de Inspeção nº 0011/2012 refere-se a contratação do objeto e fora encaminhado à Inspetoria competente, para análise e adoção das medidas cabíveis.

#### 4. ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 01 – Vista parcial do canteiro de obras - escritórios.



Figura 02 – Vista parcial do canteiro de obras – refeitório.



Figura 03 – Vista externa da área a ser construída – estacas-pranchas cravadas.



Figura 04 – Vista interna da área a ser construída – área do edifício principal.

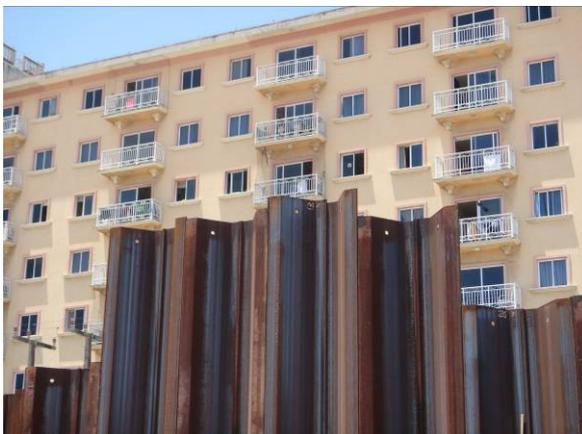


Figura 05 – Detalhe do desnivelamento na cravação das estacas-prancha.



Figura 06 – Detalhe da marcação do nível de corte das estacas-prancha.
