

Relatório de Fiscalização das Grandes Obras



PROCESSO N° 02458/2013-7

N° do Relatório de Publicação:	09/2013
Empreendimento:	Acquário Ceará
Objeto da fiscalização:	Obras Complementares de Construção do Acquário Ceará
Órgão/Entidade fiscalizado(a):	Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA
Processo de acompanhamento da obra:	02458/2013-7
Relator do processo:	Conselheiro Edilberto Pontes

2. ATIVIDADES DA COMISSÃO

Período das atividades:	28/03/2013 a 10/07/2013
Datas das inspeções:	20/03/2013 e 23/05/2013

Execução físico-financeira:

N° do Contrato	Valor Total Atualizado	Valor Pago	% Executado do Contrato*
25/2012	R\$ 21.881.484,64	R\$ 8.776.340,55	40,11%

* Valores calculados com base em informações disponíveis no Portal da Transparência em 10/07/2013.

Atividades desenvolvidas:

1 – Consultas ao Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC e ao Portal da Transparência do Estado do Ceará, com vista a obter informações a respeito da licitação e posterior contratação do serviço de obras complementares da estrutura de concreto da edificação principal do Acquário Ceará.

2 – Em 13/03/2013, foi realizada uma reunião na SEINFRA com o Secretário da Infraestrutura e sua equipe com a intenção de comunicar o início da inspeção do Contrato em tela, obter informações a respeito da obra, além de solicitar documentos.

3 – Realizou visita técnica no canteiro da obra, em 20/03/2013, com o intuito de averiguar o seu andamento. Nesta, foi verificado que:

i) havia sido concluída a colocação da 1ª linha de tirantes nas estacas-prancha e o iniciada a implantação da 2ª linha,

ii) houve alteração na destinação do expurgo do material da obra.

4 – Realizou visita técnica no canteiro da obra, em 23/05/2013, com o intuito de averiguar o seu andamento. Nesta, foi observado que:

- i) havia sido concluída a colocação da 2ª linha de tirantes nas estacas-prancha,
- ii) havia sido iniciado o trabalho do cordão de solda entre as estacas-prancha,
- iii) havia sido iniciada a instalação dos eletrodos da proteção catódica das estacas-prancha,
- iv) havia sido iniciada a execução da laje de subpressão,
- v) estava quase concluído o serviço de movimento de terra.

5 – A Comissão analisou parte dos documentos entregues.

6 – Por fim, elaborou o Relatório de Inspeção nº 08/2013, o qual subsidiou este Relatório de Publicação.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Este tópico apresenta um resumo da opinião técnica expressa nos Relatórios de Inspeção desta Comissão em relação às situações encontradas em desacordo com os critérios adotados para fiscalização. Conforme decidido pelo Pleno do TCE/CE, em Sessão Ordinária realizada em 18/12/2012, os achados de auditoria somente terão publicidade após pronunciamento dos gestores públicos envolvidos, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Os achados de auditoria apresentados no Relatório de Inspeção nº 0008/2013 serão encaminhados à SEINFRA para que os gestores apresentem os devidos esclarecimentos.

4. ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto1: Vista da obra do Acquário Ceará em

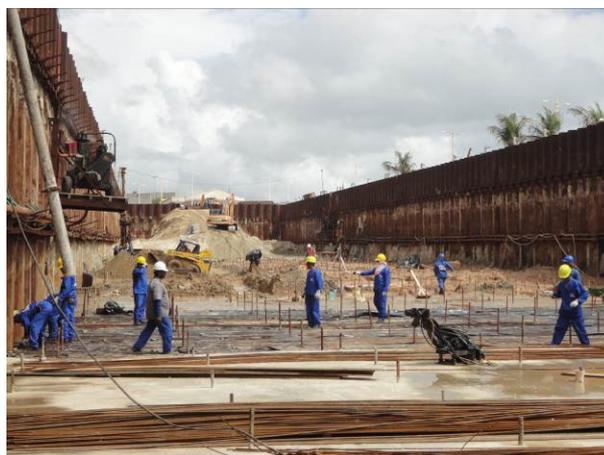


Foto 2: Vista da obra do Acquário Ceará em

20/03/2013



Foto 3: Escavações para instalação dos eletrodos da proteção catódica

23/05/2013



Foto 4: Detalhe do eletrodo instalado



Foto 5: Detalhe do cordão de solda



Foto 6: Detalhe da laje de subpressão
