

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº do Relatório de Publicação:	004/2013
Empreendimento:	Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek
Objeto da fiscalização:	Obra das Estações Metroviárias Padre Cícero e Juscelino Kubitschek
Órgão/Entidade fiscalizado(a):	METROFOR
Processo de acompanhamento da obra:	01477/2011-3
Relator do processo:	Conselheiro Alexandre Figueiredo

2. ATIVIDADES DA COMISSÃO

Período das atividades:	01/02/2013 a 27/03/2013
Data(s) da inspeção:	28/03/2013

Execução físico-financeira*:

Nº do Contrato	Valor Total**	Valor Pago***	% Executado do Contrato
21/METROFOR/2012	R\$ 19.303.666,35	239.838,92	1,24%

* Valores não disponíveis no Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC.

** Valor original do contrato.

*** Informação não disponibilizada nos sistemas corporativos do Estado (Portal da Transparência e SACC), nem no site do METROFOR.

Atividades desenvolvidas:

1 - Consulta ao Portal da Transparência e ao Site do METROFOR, em 18/03/2013, com a constatação da inexistência de informações sobre a execução financeira do Contrato 21/2012.

2 - vistoria da obra, no dia 28/02/2013. No ensejo, foi constatada que a Estação Juscelino Kubitschek encontra-se com parte da estrutura de elevação em execução, praticamente concluída, com a execução de sapatas, blocos, vigas baldrame e parte dos pilares; e na estação Padre Cícero, os serviços de infraestrutura, com a execução de elementos de fundação e suporte, após o rebaixamento do lençol freático, com a instalação de ponteiras e sistema de drenagem; e montagem da armadura de aço para o vigamento inferior da Estação.

3 - Elaboração de Relatório de Inspeção nº 03/2013 com as seguintes informações:

i) sumário do procedimento licitatório, iniciado em 02/02/2011 e concluído em 19/06/2012, tendo como vencedor o Consórcio PETRA CONVAP, com o valor global de R\$19.303.666,35 e com contrato assinado em 19/06/2012; e

ii) Atividades desenvolvidas pela Comissão.

4 – Solicitação de documentação extra para subsidiar a análise da aplicação dos recursos utilizados.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Este tópico apresenta um resumo da opinião técnica expressa nos Relatórios de Inspeção desta Comissão em relação às situações encontradas em desacordo com os critérios adotados para fiscalização. Conforme decidido pelo Pleno do TCE/CE, em sessão ordinária realizada em 18 de dezembro de 2012, os achados de auditoria somente terão publicidade após a manifestação dos gestores públicos envolvidos, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. ANEXO FOTOGRÁFICO

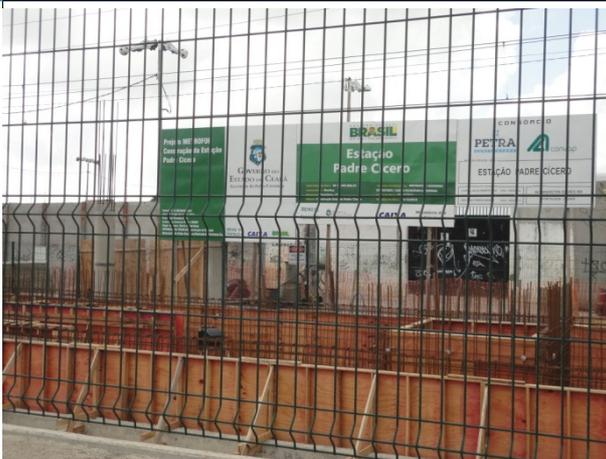


Foto 1 – Canteiro da obra – Estação Padre Cícero, na avenida José Bastos.



Foto 2 – Estação Pe. Cícero - Execução de infraestrutura e rebaixamento do lençol freático.



Foto 3 – Execução de vigas baldrame que sustentarão a laje de piso da estação Pe. Cícero.



Foto 4 – Canteiro de obras da Estação Juscelino Kubitshek (estação em elevado).



Foto 5– Pilares de apoio da estação JK (elevado).



Foto 6– Vigas baldrame e pilares da estação JK.
